

結果報告 ①

2210102 神門通り線(2工区)防災安全交付金(街路)工事第6期



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、今冬はコロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されるため、それに備えた感染症防止対策をどのように実施されているのかパトロールを行いました。この現場は出雲大社の神門通り「宇迦(うが)橋」架け替え工事における橋梁下部工事を請け負っておられます。観光客も増えている中で、日中夜間とも第三者対策が徹底されており、現場はととても綺麗に保たれています！周辺住民や地元の方へは資料を配付し、工事の進捗状況を周知されていました。周辺の景観との調和にも配慮しながら安全に工事が進められています。2現場共同の現場事務所で5名常駐されていますが、5Sが行き届いており作業しやすい環境づくりがなされていました。事務所内では必ずマスクを着用し感染防止対策も万全です。【工事進捗率:67%】

工事概要の説明



炊事場周りは清潔に保たれています




【コロナ対策は万全です】
入口付近に感染対策用品がまとめて置いてあり、打合せテーブルにはアクリル板が設置されていました。




ゴミの分別が徹底されています



【指摘事項】
倉庫内の整理整頓をお願いします。特に投光器等の配線コードが乱雑に感じましたので整備をお願いします。

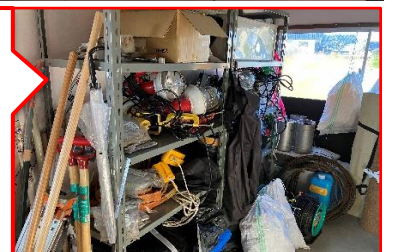

【指摘事項】現場事務所は仕切りのない対面の座席配置にされていました。中心に空気清浄機を置き、必ずマスクを着用されているとの事ですが、自席にもアクリル板を設置するなど飛沫感染対策をとられると良いと思います。

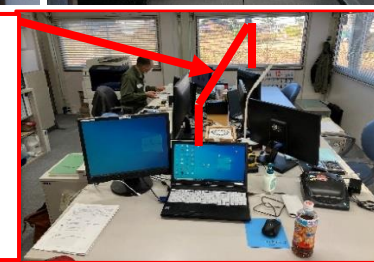

【指摘事項】現場事務所周りに資材が点在しています。資材置き場で保管するか、囲いを設けて明示をお願いします。



【指摘事項】作業員休憩所出入口横に喫煙場所が設けてありますが、受動喫煙防止のためにも出入口から離れた位置に設置をお願いします。現場事務所側については喫煙場所の明示をお願いします。



【提案】トイレの手洗い場にペーパータオルとゴミ箱を設置してはいかがでしょうか。



〈現場および現場周辺の様子〉




工事の進捗状況は、A1・A2橋台が鋼管杭基礎まで施工完了し、P1橋脚が仮締切・床掘まで施工が完了していました。A2橋台側護岸には昔の橋台をそのまま残してあるそうです。本日は作業をしていませんが、施工中は近くに変電所があるため、クレーンの旋回など特に注意を払われていたそうです。またP1橋台は河川内での作業のため水中ポンプを使用して水を排出するなど、水との戦いで大変苦労されたとのことをお話を伺いました。隣接現場と工程調整を行いながら作業が進められています。土日祝日、年末年始は作業を行わないようにし、観光客や地元の方の安全を第一に考えた工程管理がなされていました。騒音・振動にも配慮されています。



現場には救命浮環、倉庫には救命胴衣が保管されていました。救命用品も万全です！

観光客などの第三者に対しての安全対策も万全です！しまねっこバリケードが好印象でした。観光客も多いのでイメージアップにも繋がります。

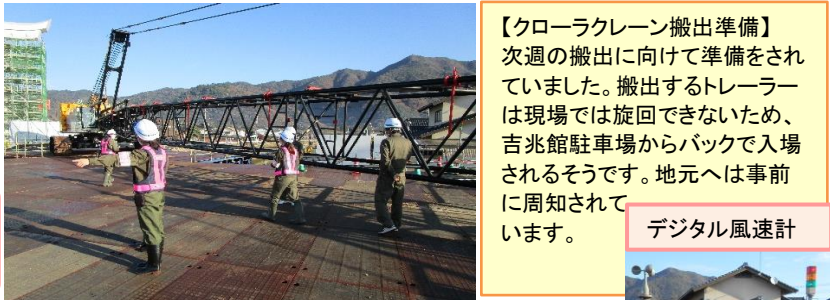


【クローラクレーン搬出準備】次週の搬出に向けて準備がされていました。搬出するトレーラーは現場では旋回できないため、吉兆館駐車場からバックで入場されるそうです。地元へは事前に周知されています。

デジタル風速計



【指摘事項】 クランプカバーが何箇所か破損していました。交換をお願いします。



【指摘事項】 水中ポンプとパイプが放置されていました。すぐに使用されない場合は資材置き場で保管するか、囲いを設けて明示をお願いします。

【作業員休憩所付近指摘事項】

- ①作業員休憩所の整理整頓・清掃をお願いします。(入口付近の私物の撤去、泥汚れの清掃・シンク周り等)
- ②仮囲いの裏に置かれている看板について、すぐに使用されない場合は資材置き場または倉庫で保管をお願いします。

指摘事項

①指摘事項



②指摘事項



【指摘事項】 使用期限が切れている薬品について、処分をお願いします。救急箱と担架の明示をお願いします。担架の明示は保管場所だけでなく外からも分かる位置にも明示があると良いと思います。

【指摘事項】 木の囲い用に設置されているフェンスネットについて、たるみなく張られると見栄えが良くなると思います。



今後寒さが厳しくなり、体調も崩しやすい時期です。感染症防止対策に加えて、体調管理にも十分気を配り、無事故・無災害で竣工を迎えられることを心より願っております。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

けんせつ小町 KENSETSU-KOMACHI
