


結果報告 ① 1910118 大田静間道路鳥井地区改良第4工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面に加えて、今回は新型コロナウイルス感染症防止と熱中症防止をあわせた対策をどのように実施されているかパトロールを行いました。コロナ対策として事務所内にビニールシートや衝立・消毒液・非接触型体温計での現場入場者の体温測定など対策は万全でした。熱中症対策においては、熱中症対策キットや汗拭きシートまで完備されておりウォーターサーバーや氷嚢機も設置されました。台風接近に伴いシートやのぼり旗などたたんでありましたが看板やカラーコーンは適切に配置され注意喚起されています。【工事進捗率:43.6%】

〈現場事務所・周辺、休憩所の様子〉  
 整理整頓が行き届いており、とても綺麗です。

工事概要の説明



新型コロナウイルス感染症防止対策



熱中症対策も万全です！（熱中症対策キット・ウォーターサーバーなど）



喫煙所の表示があると良いと思いました。



クランプカバーを被せられたほうが良いと思います。



週休2日の確保がされています

表		令和2年9月	
日	月	日	月
4	15	16	17
18	19	20	21
22	23	24	25
26	27	28	29
30			

除草されており綺麗です




救急箱の薬品が一覧表付きで管理されておりわかりやすくよいと思いますが、更新をお願いします。必要な薬の交換・不要なものは処分をお願いします。

消火器の表示が1か所ありませんでした。表示をお願いします。（現場事務所入口）

コンテナの交換をお願いします。飛散防止ネットは張ってありますが

指摘事項

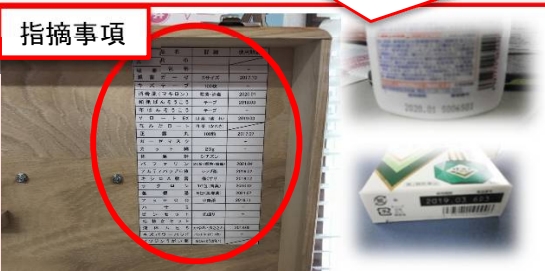

指摘事項



指摘事項



〈現場および現場周辺の様子〉



この現場はカルバート工の場所打函渠工が主な工種となりますが付属する工種が多くあり、施工管理が難しい現場です。1回目のパトロールでの作業内容は、カルバートの鉄筋組立と補強土壁の設置を行っていました。カルバート作成に伴う足場が設置されていましたが、台風接近に伴い飛散防止対策がなされていました。普段は垂幕等で注意喚起を行い、ネットを設置し転落防止対策に努めておられます。現場付近には住宅が多くあり、地域貢献を積極的に行い、地域の方々へ配慮されていました。



足場(台風対策)



足場完了時



最大積載量の明示




新規入場者教育

熱中症測定器(デジタル表示)



現在女性作業員の方はおられませんでしたが、女性用トイレが準備されています。



現場状況・体調面等お話を伺いました!



塩化カルシウムは粉塵対策との事です!



現場へ向かう途中の道路を横断しているケーブルプロテクターが破損しています。ケーブルの切断やトラックのパンクに繋がるとお思いますので、カバーの交換をお願いします。

現場出入口の安全掲示板には近隣の子供たちの絵や毎月の工事情報誌が掲示してあり、一般者の目を引く工夫がされています。



指摘事項



まだまだ暑い日が続きます。今年は熱中症対策の上に、新型コロナ対策をしなければならぬという例年とは異なる夏場の作業です。体調管理にも十分注意をして工事を進めていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。ご安全に!!
