

結果報告①

2410110 令和6年度出雲湖陵道路東神西地区防護柵設置工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。また、例年より気温が高い日が続いているので熱中症対策についても確認を行いました。

現場事務所は、水回りや共同スペースの清掃が行き届いていました。空気清浄機もあり、清潔にしておられました。観葉植物もいたるところに置いてあり、とても和みました。体温計、アルコール検知器、血圧計を設置しておられました。日々の健康管理に役立てられています。熱中症対策として水分・塩分補給商品や緊急時に使用できる応急処置セットが置いてありました。【工事進捗率:15%】

工事概要の説明



トイレの前には目隠し扉が設けられていました。女性目線としてはとても良い配慮です。



【指摘事項】

飲料水が段ボールごと積み上げて保管されていました。倒れる可能性がありますので、置き方と置き場所の検討をお願いします。



【指摘事項】

コンセントが通路側にはみ出ていました。躓きの原因になりますので、通路にはみ出さないよう設置をお願いします。



【指摘事項】

食器棚上に荷物が置かれていましたが、落下すると危険です。落下防止措置を取られるか片付けをお願いします。



【指摘事項】

倉庫横のスペースには看板と脚立などが置いてあり、現場事務所裏には複数のポリタンクとほうきが置かれていました。すぐに使用されない場合は倉庫で保管をお願いします。



【指摘事項】

現場事務所にあるトイレの臭いが気になりました。芳香剤を設置するなど消臭対策をお願いします。



【指摘事項】

産廃コンテナ横に土のう袋が置かれていました。分別用のゴミ袋として使用されているのであれば、産廃コンテナと土のう袋の周りに囲いと明示をお願いします。

〈現場および現場周辺の様子〉




この現場は、山陰道出雲湖陵道路において、ガードレール、立入防止の防護柵工、視線誘導標、ポストコーンなど道路附属施設工を行います。

今回は、橋台周辺と切土法肩に立入防止柵を設置しておられました。立入防止柵の施工は、法面での作業となるため、親綱が設置されており、作業員は安全帯を着用して安全に作業をしておられました。

現場は施工範囲が他工事と重複しているため、本工事作業エリアの区画には、自社の安全垂幕を設置して明確化しておられました。



現場トイレとして、車載式トイレを採用しておられました。車載トイレ周辺には、救急搬送用具として、けが人をおんぶして固定する「おんぶ隊プラス」を設置されていました。

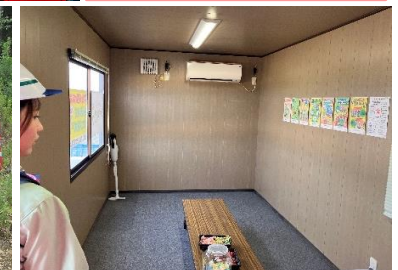

熱中症対策として、現場事務所はエアコンハウスを採用しておられ、水分と塩分補給が出来るように整備されていました。自社の現場休憩所であることが分かるように休憩所の周辺を青ネットで囲い、安全垂幕で明示しておられました。



【指摘事項】

車載トイレの助手席に救急箱が設置されていますが、表示がありませんでした。作業されている方から見えやすい位置に表示をお願いします。



現場の施工範囲が広く、常に移動しながら作業を行うので、手で持ち運びのできるWEBカメラを設置しておられました。移動しながらリアルタイムで現場を確認することが出来ます。



【指摘事項】

現場の資材置き場に囲いと明示をお願いします。作業員休憩所裏に置かれている資材は、資材置き場に移動をお願いします。



【提案事項】

作業場所周辺には日を遮るものはありませんでした。熱中症対策として、作業場所近くにも日影を設けて小休憩できるようなスポットがあると良いと思いました。(現場用日よけパラソル+充電式ミスト扇風機の設置など)

厳しい暑さが続き、危険な気温になっており、熱中症のリスクが高まっています。

現場では熱中症対策が万全に整えられていました。引き続き、熱中症予防と体調管理に十分気をつけて安全に作業なさってください。

皆様ありがとうございました。ご安全に！！
