

結果報告 ①

2510103 神門通り線(2工区)防安交付金(街路)工事第14期



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面のパトロールを行いました。



現場事務所は、複数の神門通り線工事が共同で使用されているため、限られたスペースですが、整理整頓されており、スペースを有効活用されていました。

現場事務所及び休憩所は、清掃が行き届いており、清潔に保たれていました。特に水回り関係がきれいになっていました。

休憩所のアコンハウスには、熱中症対策として水分や塩分を常設しておられました。また、各作業員が熱中症予防自己チェックシートを記入しておられました。

【工事進捗率:69%】

工事概要の説明

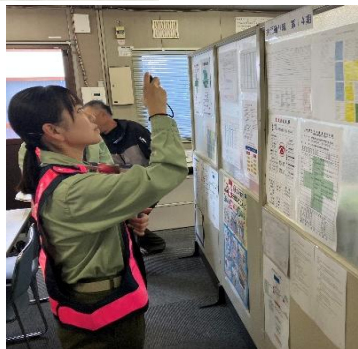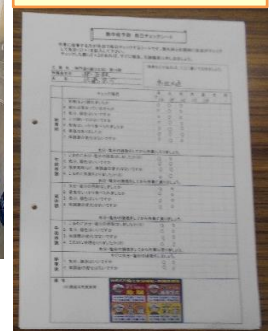熱中症予防
自己チェックシート

雑草が伸びやすい時期ですが、現場事務所周辺は除草されており、こまめに職場環境を整えていることがうかがえました。



【指摘事項】

棚の上に物が置いてありました。落下すると危険ですので棚の上には物を置かないでください。



【指摘事項】

トイレは清掃されていましたが、トイレットペーパーの芯がありました。芯は捨ててください。


【提案】

仮設トイレ内は気温が高いため、サーキュレーターやスポットクーラーを活用されることを提案します。



【指摘事項】


休憩所にブルーヒーターと段ボールが置いてありましたが、不要でしたら返却及び処分をお願いします。

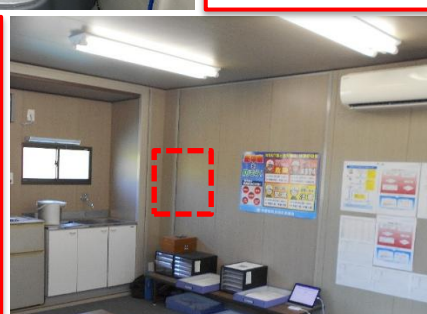

【指摘事項】

休憩所に救急箱が置いてありましたが、救急箱の明記がありませんでした。誰でも分かるように明示してください。

〈現場および現場周辺の様子〉

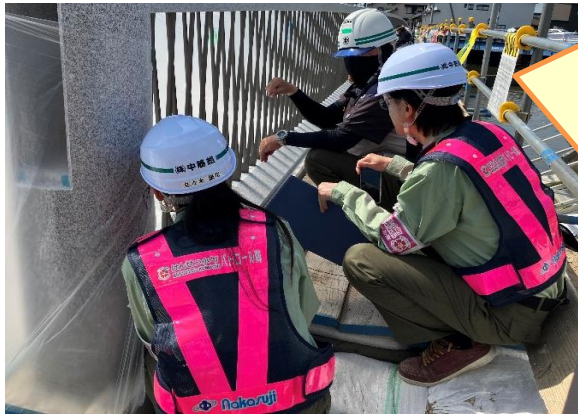

現場では、新設する宇賀橋の高欄設置工を施工されており、他工事と調整して作業を進めておられました。高欄は出来ばえが良くなるよう丁寧に施工されていました。

第三者に対する安全対策を徹底し、地元住民の方に配慮しながら施工されていました。なかでも、観光客向けに英語や中国語で注意喚起を促す工事看板を設置しておられたことが印象的でした。

現場内にWBGT計測器や熱中症対策を呼び掛ける垂幕などを設置しておられました。職員は作業員へこまめに声掛けを行い、熱中症対策を徹底しておられました。



工事看板には、神門通り事業の内容が分かる島根県HPのQRコードやAR技術により「しまねっこ」と記念撮影ができるQRコードを掲載されていました。観光地ならではのとても良い取組だと思いました。



高欄

親柱

夜間には柔らかな光の間接照明となるように傘型のLEDライトを設置されます。

熱中症対策
良好です◎

【提案】

現場を見学した際に、快晴だったこともありとてもまぶしく感じました。作業員が作業しやすいようにサングラスやアイブラック(目の下に黒いラインを引く)をされることを提案します。



【指摘事項】

足場上での作業時は安全帯の使用を指示しておられると思うので、作業員へ安全指導をお願いします。



【指摘事項】

担架等の緊急用品が見当たりませんでした。いつでも使用できるように緊急用品を設置してください。



【指摘事項】

現場で使用している電工ドラムがコードが巻いてある状態で横向きになっていました。使用時はコードをすべて出して縦向きで使ってください。

厳しい暑さが続き、熱中症リスクが高まっています。今後も熱中症対策を万全に行ったうえ、体調管理にも気を付けていただき、このまま無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！



けんせつ小町
私たちの明るい未来へ、着々と
