

結果報告 ①

2510106 令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面について2回目のパトロールを行いました。


前回と同様に現場事務所は、3現場で共用されており、高松地区は1階の右側に拠点を設けておられました。室内は清掃が行き届いており、清潔に保たれていました。

大型モニターはWEBカメラの映像を見るのに活用されていますが、他にも職員の予定を確認できるカレンダーも見れるようになっていました。これにより職員同士の情報共有を円滑に行っておられました。


前回の指摘事項が是正されており、現場事務所及び休憩所の環境が改善されていました。

【工事進捗率：66.7%】


工事概要の説明

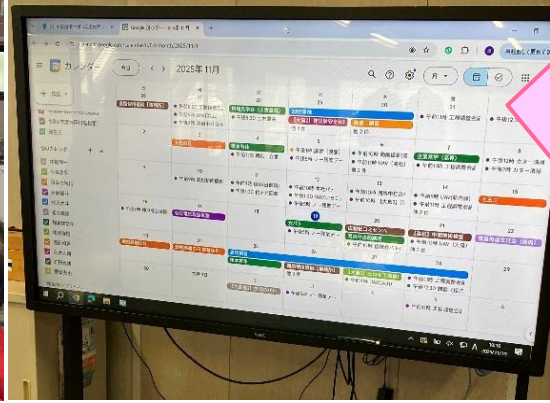

カレンダーは個別に色分けされており、誰が何時に何をするのかを記入し、リアルタイムで共有されています。神戸川工事3現場で施工時の情報共有も含めて有効的に活用されています。

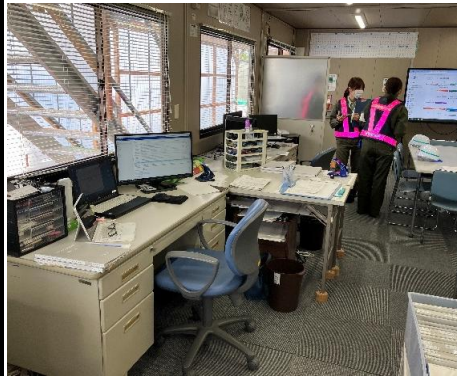

水回りもキレイです

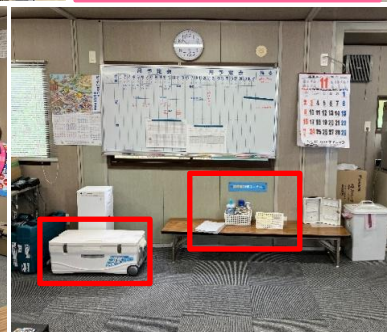

【指摘事項】事務所や休憩所に熱中症対策備品が残っていました。今後は熱中症のリスクはないので、熱中症対策備品は片づけて、感染症対策に関する備品をそろえてください。



【指摘事項】非常時用に置いてある懐中電灯の電池が切れていたので交換してください。また、不要なものは片づけてください。



【指摘事項】倉庫内が乱雑になっていたので整理整頓してください。



〈現場および現場周辺の様子〉



この現場は、施工箇所が上流工区と下流工区と分かれており、今回は上流工区では矢板の埋戻し作業、下流工区では矢板圧入準備を見させていただきました。

当日は中間検査の前日であり、上流工区では場内を整えておられました。下流工区では矢板を圧入するための架台設置と床掘の安全施設を整えておられました。

上流工区は矢板の圧入及び切断作業が終わり、出来形管理として規格値の50%以内で完成していました。



高圧電線が近くにあるため、クレーンには安全装置として起伏・旋回ロック装置を搭載し、電線にクレーンが接触しないように3Dバリア(3Dモニタリングシステム)を活用されていました。今回は3Dバリアに必要なGPSシステムを見ることができました。クレーンの先端が侵入禁止エリアに近づくとパトライトが点灯し、音声により周知してくれます。パトライトは3段階に分かれており、侵入禁止エリアから2mずつ離れたところに設定しておられます。



【指摘事項】安全通路で番線がくっついていない箇所がありましたので補修してください。



【指摘事項】吸い殻入れがタバコとゴミであふれていたため処分してください。また、引火の原因となるようなゴミは吸い殻入れに入れないように指導してください。

【指摘事項】吸い殻入れの横にある消火器が緊急時に取り出せないようになっていますので改善してください。




【指摘事項】注意喚起旗がポロポロですので交換してください。



【指摘事項】安全通路の手すりが突起物になってしまうので、建込み単管を設置するか目印(蛍光ピンクのリボン等)をつけてください。



【指摘事項】沈砂池を囲っているネットが壊れていたので修繕してください。

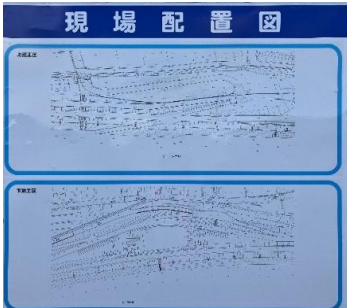

【指摘事項】工事情報看板の記載がない部分がありましたので、今後は有効活用してください。

今後寒さが厳しくなり、体調も崩しやすい時期です。感染症予防対策にくわえ、体調管理にも十分気をつけていただき、無事故・無災害で竣工されることを心から願っています。皆様ありがとうございました。ご安全に！！

