

結果報告 ①

2540118 十六島漁港海岸 海岸メンテナンス事業 2号離岸堤工事その1



けんせつ小町パトロール隊として、安全衛生面についてパトロールを行いました。この日は雪が降っており、現場は休工されていました。

現場休憩所は、整理整頓されており、清潔に保たれていました。現場休憩所に災害時のハザードマップが掲示されており、津波時の避難先やAEDの設置箇所が記されていました。安全訓練において、作業員の避難訓練も実施されており、地震発生時には迅速な対応ができたそうです。

現場休憩所の出入口に泥落としパレットがしかけていました。足についた雪を落とすことができるとも良かったです。

【工事進捗率: 40.0%】




工事概要の説明




現場休憩所




安全掲示物

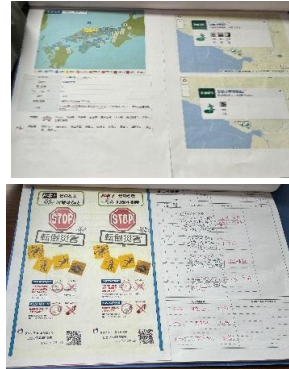


この工事の安全書類を確認させていただきました。所長の安全指示事項が的確であり、安全意識の高さを感じました。安全衛生工程打合せ簿では、事前に必要な資料を添付して分かりやすく指導しておられました。当たり前だけどもおろそかにしない所長の「安全がすべてに優先する」高い意識で現場環境を整えておられることがうかがえました。



【指摘事項】
救急箱にホワイトテープ、ピンセットがありませんでしたので補充してください。



【指摘事項】
現場にある社旗と吹流しがボロボロだったので新しいものに交換してください。

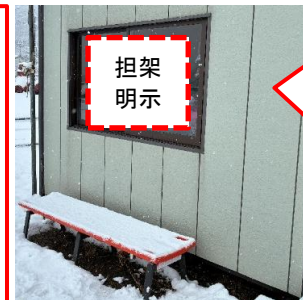

【指摘事項】
現場に担架がいましたが、誰でも緊急時に使えるように明示をしてください。

〈現場および現場周辺の様子〉



この工事は消波ブロック(シェクブロック)を45個製作します。消波ブロックの形状は玉掛が難しく、専用の吊具で約20tの消波ブロックをクローラークレーンで吊り上げます。消波ブロックの製作は、型枠を6組使用して、1日あたり3個ずつ打設を行います。打設をする際には、型枠の高さに合わせた足場をクローラークレーンを使用して設置し、作業員が転落しないように安全帯を着用して行います。

パトロール当日は雪が降っており、作業を中止しておりましたが、養生中の消波ブロックは冬場の温度低下を防ぐために専用のシルバーシートをかけて養生しておりました。

消波ブロック



玉掛ワイヤー

型枠



吹き流し




十六島海岸 海岸メンテナンス事業 自令和 7年12月 9日
2号離岸堤工事 その1 至令和 8年 3月27日



【提案事項】
現場に喫煙所がありませんでしたので、喫煙者がポイ捨て等しないように啓発ポスター等を掲示されることを提案します。



【指摘事項】
① 足場で飛び出ている単管には突起の目印としてピンクリボン等でマーキングしてください。
② 足場の昇降階段に、「昇降階段」の明示がありませんでしたので掲示してください。
③ 足場の上では安全帯を着用するよう、注意喚起垂幕を掲示してください。

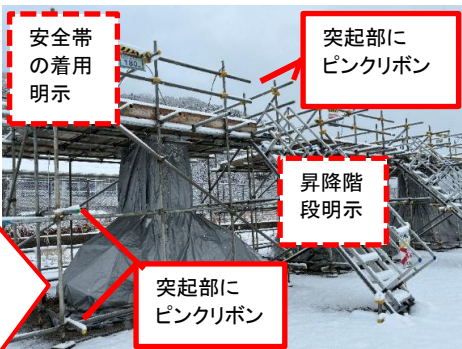

安全帯の着用明示

突起部にピンクリボン

昇降階段明示

突起部にピンクリボン

【指摘事項】
現場に資材が点在して置いてありましたので、資材置場を設けて保管してください。資材置場には囲いと明示をしてください。



【指摘事項】
クローラークレーンが稼働している際に、作業員が立ち入らないための立入禁止処置をしてください。



厳しい寒さが続き、体調を崩しやすい時期です。感染症予防対策にくわえ、体調管理にも十分気を付けていただき安全に作業なさってください。
皆様ありがとうございました。
ご安全に！！

